AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

EPAGE LOIRE LIGNON

Contrat Territorial « Loire et Affluents Vellaves »

Comité de Pilotage

Le 24 octobre 2023 à Monistrol-sur-Loire

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

ORDRE DU JOUR

- **Bilan technique du contrat territorial 2021-2023** :
- Volet A: Milieux aquatiques
- Volet B: Qualité - Quantité
- Volet C: Communication et suivi
- Volet D: Structure
- Bilan financier

- **Prévisionnel des actions 2024-2026 :**
- Volet A: Milieux aquatiques
- Volet B: Qualité - Quantité
- Volet C: Communication et suivi
- Volet D: Structure
- Budget prévisionnel

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Rappel du CT

- Territoire : 10 communautés de communes, 116 communes, 20 masses d'eau
- Élaboré en concertation avec un grand nombre d'acteurs en prenant en compte les spécificités du territoire
- La première phase du contrat **2021-2023** approuvé par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne le 09/03/2021
- Répondre aux enjeux de maintien et de restauration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques
- Programme de 3 ans composé de 51 fiches actions réparties en 4 volets pour un total d'environ 8.8M€
- 11 signataires : Agence de l'eau Loire Bretagne, Département 63, Département 43, FDPPMA 43, EPAGE Loire Lignon, FD Cuma 43, CEN Auvergne, Haute Loire conseil élévage, Haute Loire Bio, Chambre Agri 43, GIEE los Bons Prats,
- 8 maîtres d'ouvrage : EPAGE Loire Lignon, FD Cuma 43, CEN Auvergne, Haute Loire conseil élevage, Haute Loire Bio, Chambre Agri 43, GIEE los Bons Prats **+ Missions Haies + ONF + CENRA + FDPPMA42**

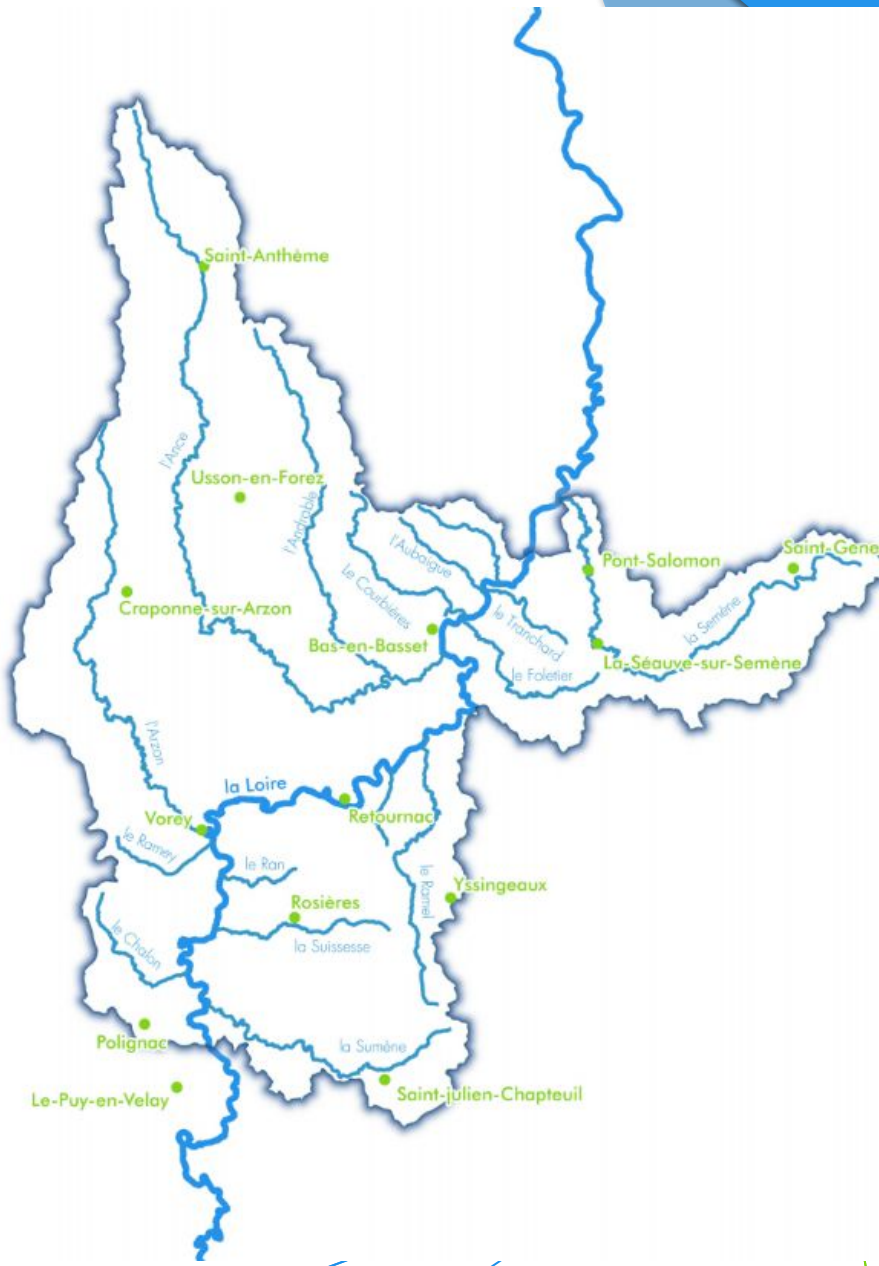

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Rappel du CT

- Une feuille de route et une stratégie du territoire élaborée sur 6 ans

- Une équipe de 6 personnes : Jonathan Russier, Lauriane Chautard, François Latte, Jessy Verrier, Etienne Grès, Clémence Royer

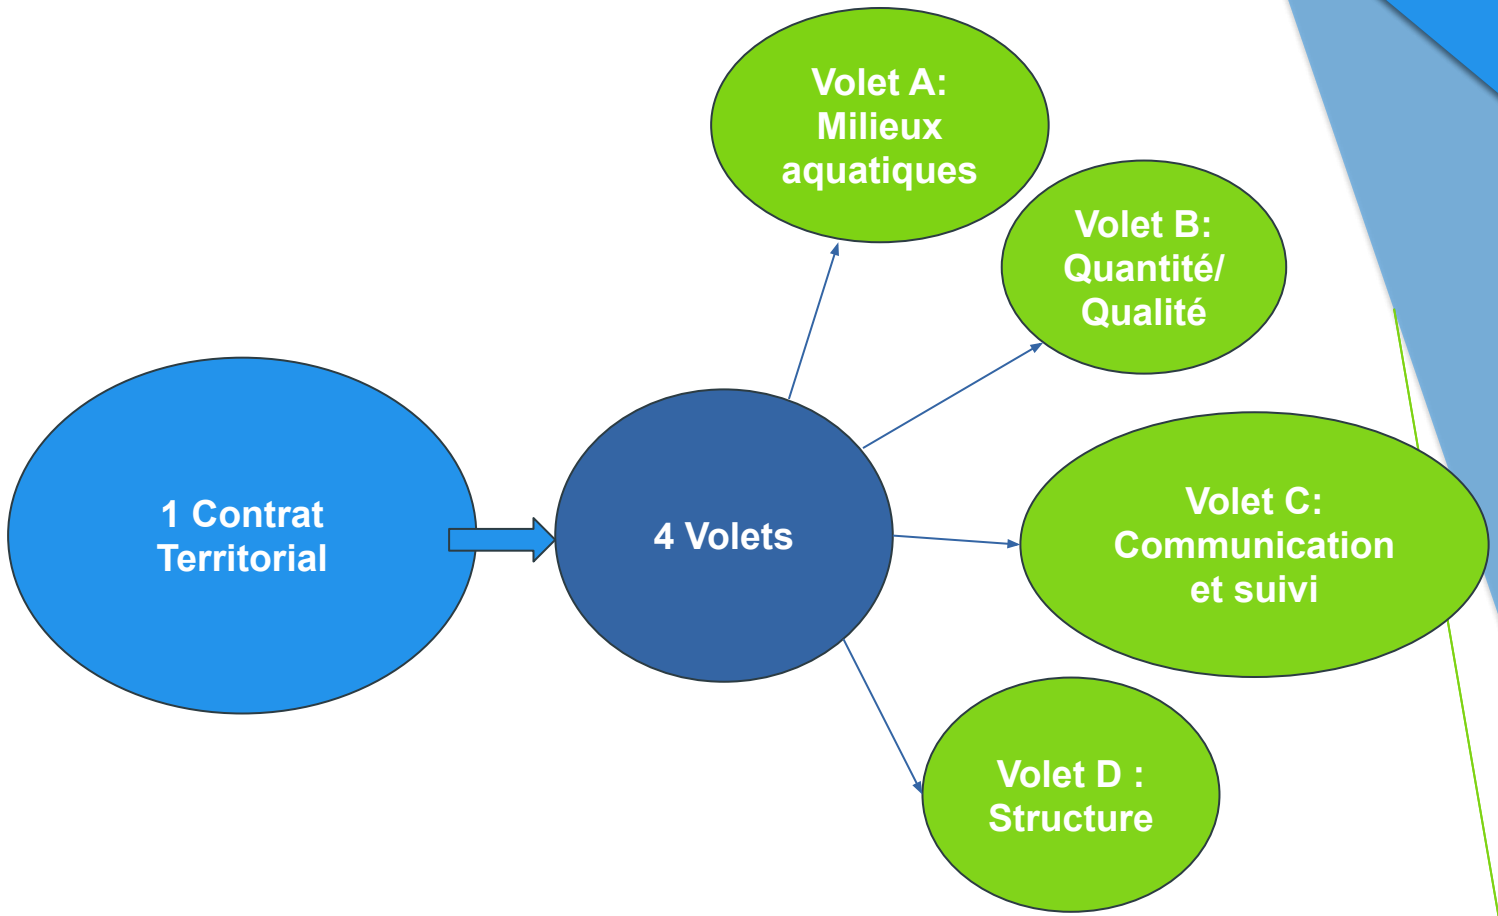

- Questionnaires transmis aux communautés de communes + sollicitation des MO pour le bilan — **mars 2023**
- Réunions avec le maîtres d'ouvrage et partenaires par thématiques — **10 et 11 Octobre**
- COPIL bilan 2eme phase — **24 Octobre**
- Rencontres EPCI — **Octobre/Novembre**
- Dépôt CT à l'AELB — **15 Décembre**
- CLE SAGE LA CLE LRA — **janvier - février 2024**
- Lancement 2eme phase — **mars 2024**

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Bilan du Contrat Territorial 2021-2023

Volet A : Milieux aquatiques

- 33 fiches action / 2 maîtres d'ouvrage
- Points positifs :
  - Objectifs atteints sur 2 ME du CT + partiellement atteints sur 2 autres ME
  - Travaux structurants menés en 2023 comme la restauration hydro-morphologique de la Mûre (St-Victor-Malescours)et le ruisseau du Fraisse à Saint Julien Chapteuil,
  - Lancement des inventaires APP, loutres, castors
  - continuité écologique: 3 ouvrages supprimés
  - Travail de la cellule d'assistance technique zones humides (CEN Auvergne) permet de déboucher sur des travaux de restauration pour la 2ème phase
  - Lancement de l'inventaire des mares
  - Mise à jour / rédaction de document de gestion (notices+diagnostics fonctionnels) sur la partie ZH
  - Travaux de valorisation sur la zone humide du Champs du Cros à St Victor-sur-Arlanc

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Bilan du Contrat Territorial 2021-2023

Volet A : Milieux aquatiques

- Points négatifs :
  - Délai de 15 mois pour avoir la DIG,
  - Augmentation de la taille du territoire, mitage des actions
  - Problèmes de dimensionnement des actions, cellule d'animation,
  - Modification de la réglementation des ouvrages (continuité) et la suppression de la rubrique 31.50,
  - Multiplication des financeurs + taux par FA, chronophage,
  - Lourdeur administrative liée au bilan mi-parcours
  - Arrêt des chantiers en juillet/août 2023 pour faire le travail de l'animation générale (bilan + nouvelle programmation)

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Bilan du Contrat Territorial 2021-2023

Les travaux conduits par les technicien de rivières en 2021-2023 ont permis (en mètres linéaires de berges)

- **3000 m linéaires de plantations**
- reculer **600 m linéaires de résineux ;**
- intervenir sur **9.6 Km linéaires en maîtrise de piétinement ;**
- créer **25 points d'abreuvement et/ou gués ;**
- restaurer **500 m linéaires de berges en génie végétal ;**
- nombre de mares inventoriées **135 mares ;**
- **1 valorisation de ZH,**
- intervention sur la continuité (effacement d'ouvrage) : **2.**

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Volet B : Quantité – Qualité

- 14 fiches action / 6 maîtres d'ouvrage (EPAGE, CA43, HLB, FDCUMA, GDA, HLCE)
- Points positifs :
  - 32 diagnostics - MAEC 12 MHU + 8HBV1 + 4HBV2 + 8 Biodiv (CA43)
  - 3 concours des pratiques agroécologiques
  - Haies : 24 diagnostics , 3221 ml plantés + 578m ml (plan relance) + démo d'outil d'entretien
  - 1 salon agricole de promotion des pratiques agroécologiques
  - 4 expérimentations
  - Animation conversion bio + études filières innovantes bio
  - 1 étude antiparasitaire
  - Une étude HMUC qui permettra d'actualiser les données du bassin versant
- Action hors CT
  - Etude PI
  - entretien de la ripisylve sur secteurs à enjeux
  - PAEC : animation, suivi, formations
- Points négatifs :
  - Certaines actions n'ont pas pu avoir lieu
  - 3 changements d'animateurs agricoles

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Bilan du Contrat Territorial 2021-2023

Volet C: Communication et suivi

- 3 fiches action / 1 maîtres d'ouvrage
- Points positifs :
  - Lancement du suivi qualité des eaux + micropolluants
  - 3 programmes pédagogiques et 37 écoles sensibilisées,
  - matériels supports créés, (rolls up, maquette)
- Points négatifs :
  - mise en place d'un programme pédagogique, chronophage
  - surdimensionnement du nombre d'écoles sélectionnées
  - Pas de mise en place d'outil de communication trimestriel,
  - Problème de mise à jour du site internet et réseau social

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Bilan du Contrat Territorial 2021-2023

Volet D: Structure

- 2 fiches action / 1 maîtres d'ouvrage
- Points positifs :
  - recrutement d'une chargée d'étude agricole en juillet 2022 (0,6 ETP)
- Points négatifs :
  - départ de l'animateur thématique "cours d'eau" en avril 2023
  - départ de l'animateur agricole en juillet 2023
  - Arrêt de travail (sans remplacement) de l'animateur général depuis juillet 2023

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Bilan financier Contrat Territorial 2021-2023

Synthèse budgétaire par volet d'action 2021-2023

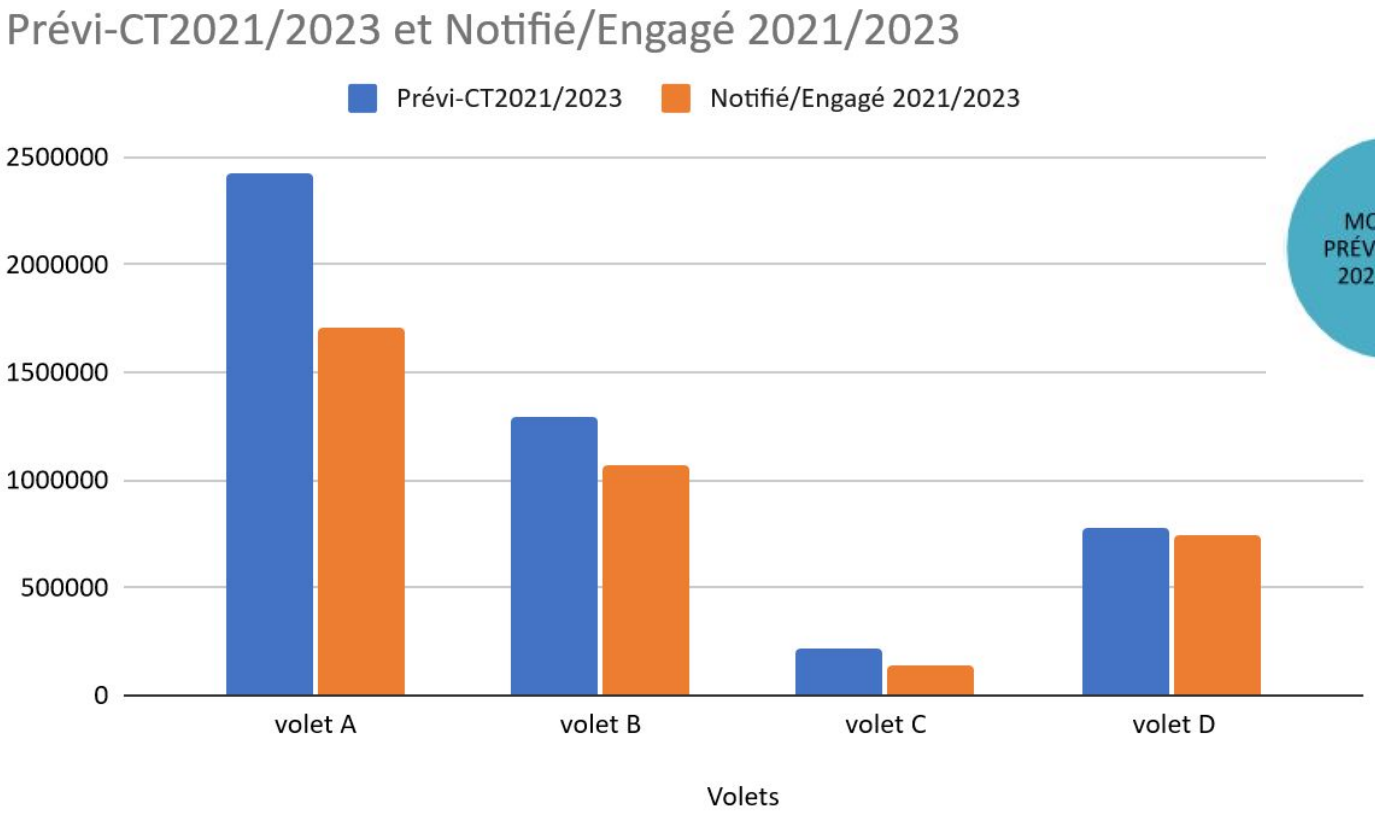

MONTANT PRÉVISIONNEL 2021 - 2023 : 4 714 784 €

MONTANT RÉALISÉ 2021 - 2023 : 3 653 268 €

Le montant réalisé correspond au montant engagé auprès de l'AELB et non aux dépenses soldées.

→ Au total 77 % de réalisation

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Bilan financier Contrat Territorial 2021-2023

Répartititon du budget engagé par volet

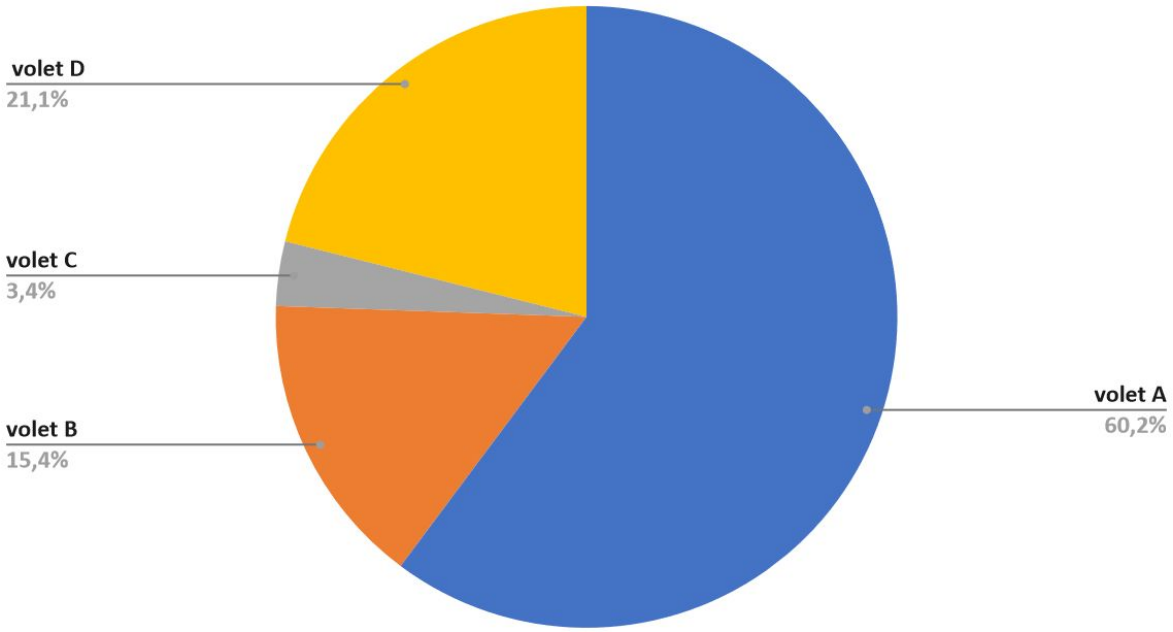

Répartition budgétaire par financeurs du CT

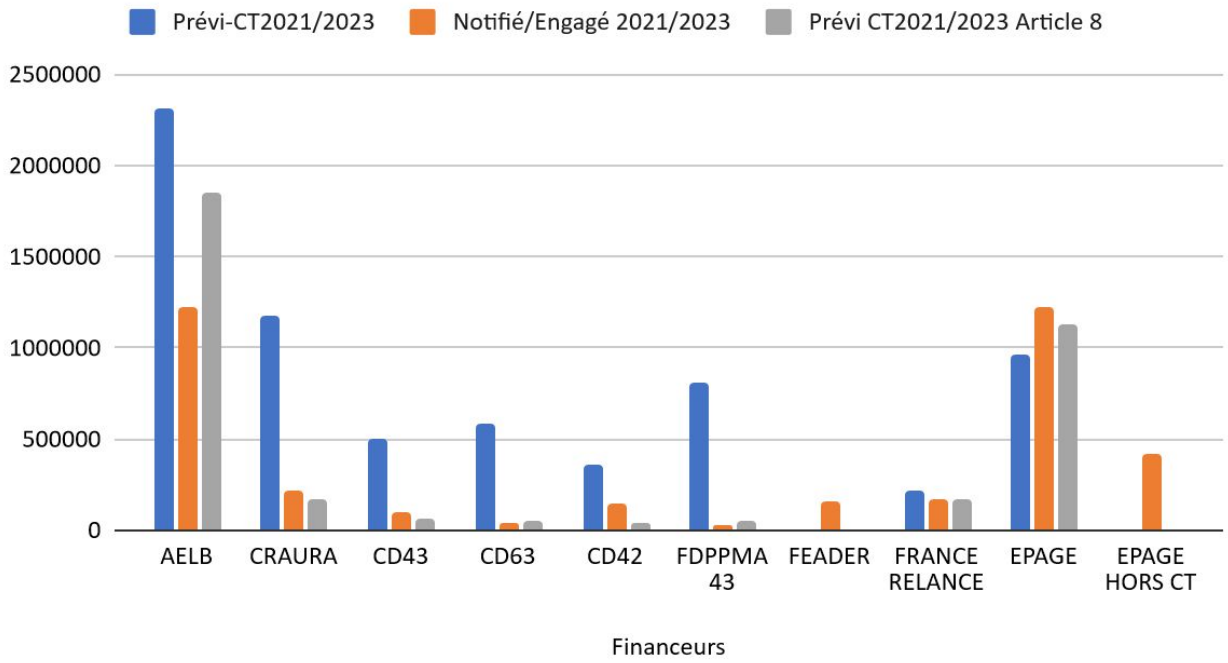

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Prévisionnel d'actions 2024-2026

Volet A : Milieux aquatiques

- 36 fiches action / 5 maîtres d'ouvrage
- 3 maîtres d'ouvrage souhaite intégrer le CTLAV : FDPPMA42, le CEN Rhône-Alpes et l'ONF
- 3 nouvelles fiches action proposées (MO: EPAGE LL, CEN Rhône-Alpes et l'ONF)
- 7 fiches action avec 2 MO

- Poursuite des travaux types sur les masses d'eau identifiées
- Poursuite des diagnostics ZH (CEN auvergne + CEN Rhône-Alpes)
- Poursuite de l'inventaire mares et restauration / Inventaires complémentaires des ZH
- Lancement de l'étude de faisabilité sur 5 ouvrages (à définir)
- Bancarisation des données d'inventaire (APP + MM) et travaux associés

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Prévisionnel d'actions 2024-2026

Volet A : Milieux aquatiques

- 1 FA proposée par l'EPAGE LL (A1k)

- Action: travaux types sur la ME du Courbières et ses affluents
- Objectifs : lutte contre le piétinement des berges, restauration hydro-morphologique par coupe de résineux et plantation de ripisylve,
- Coût total estimatif : 10 000 € /an
- Financeurs potentiels: AELB (30%), FDPPMA 43 (5%)

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Prévisionnel d'actions 2024-2026

Volet A : Milieux aquatiques

- 1 FA proposée par le CEN Rhône-Alpes (A4e-11)

- Action: préservation et restauration des zones humides du près du marais et du marais de la Chapelle
- Objectifs: Mise en oeuvre des actions des notices de gestion
- Coût total estimatif: 140 000 €
- Financeurs potentiels: AELB (80%)

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Prévisionnel d'actions 2024-2026

Volet A : Milieux aquatiques

- 1 FA proposée par l'ONF (A4h)

- Action: animation pour la préservation et la prise en compte des zones humides en forêt publique
- Objectifs: veiller à la préservation des zones humides en forêt publique et des milieux aquatiques auprès des propriétaires forestiers et des gestionnaires
- Coût total estimatif: 29 000 €
- Financeurs potentiels: AELB (50%), FEDER Aura (20%)

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_410-DE
Reçu le 01/12/2023

VOLET A						
A1						
FA	descriptions	année 2024	année 2025	année 2026	total	Maître d'ouvrage concerné
A1a: MASSE D'EAU LE FLETET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE (FRGR1902)	travaux types bibliographie sur l'ensablement	31 000 €	21 000 €	21 000 €	73 000 €	EPAGE LL
A1b: MASSE D'EAU DE LA SUMENE ET SES AFFLUENTS	Travaux types : Mise en défens des berges Action 1 : Travaux supplémentaires post crue du Fraisse Action 2 : Restauration du ruisseau du Neyzac Action 3 : Etude préalable à la restauration hydromorphologique Sumène à Blavozy Action 4 : Restauration de berge sur la Sumène, stade de Saint-Julien-Chapteuil	50 000 €	80 000 €	30 000 €	160 000 €	
A1c: MASSE D'EAU CHALON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE (FRGR1751)	Travaux types	10 000 €	40 000 €	30 000 €	80 000 €	
A1d: MASSE D'EAU DE L'ARZON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE (FRGR0158)	Travaux types action1: décharge de l'aubrigoux	50 000 €	50 000 €	50 000 €	150 000 €	
A1e: MASSE D'EAU DE LA SEMENE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA SEAUVE-SUR-SEMENE (FRGR0164A) ET DE LA SEMENE DE LA SEAUVE-SUR-SEMENE JUSQU'A LE RETENUE DE GRANGENT (FRGR0164B)	Travaux types action 2: étude post-crue ruisseau des Eygats	20 000 €	28 000 €	25 000 €	73 000 €	
A1f: MASSE D'EAU DE L'ANCE DU NORD ET SES AFFLUENTS DEPUIS SA SOURCE JUSQU'A TIRANGES (FRGR0163A)	Travaux types Action 1 : Travaux de restauration hydromorphologique du Champdieu	85 000 €	45 000 €	50 000 €	180 000 €	
A1g: MASSE D'EAU DE L'ANCE DU NORD ET SES AFFLUENTS DEPUIS TIRANGES JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE (FRGR0163B)	Travaux types Action 1 : Travaux de remise en fond de vallon de L'andrable à La Plagne	30 000 €	70 000 €	20 000 €	120 000 €	
A1h: MASSE D'EAU DE LA LOIRE DEPUIS LA BORNE JUSQU'AU COMPLEXE DE GRANGENT (FRGR003A)	Travaux types : Suppression Erable Negundo Dépollution décharges	0 €	20 000 €	0 €	20 000 €	
A1i: MASSE D'EAU DE LA SUISSESSE DEPUIS SA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE (FRGR0159)	Restauration hydromorphologique du Roudesse Action 2 : Traitement de la décharge de Beaulieu Hors CT* MO EPCI Action 3 : Restauration Suissesse à Bolio	0 €	30 000 €	46 000 €	76 000 €	
A1j: MASSE D'EAU DU RAMEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE (FRGR0160)	Travaux types Action 1 : Etude hydromorphologique Crisselle en aval d'Yssingeaux Action 2 : Restauration hydromorphologique Crisselle en aval d'Yssingeaux	10 000 €	30 000 €	58 000 €	98 000 €	
A1k: MASSE D'EAU DU COURBIERE ET SES AFFLUENETS DEPUIS LA SOURSE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE (FRGR1936)	Travaux types Action 1 : Gestion de l'ensablement et diversification des écoulements sec	10 000 €	30 000 €	11 500 €	51 500 €	
TOTAL		**296 000 €**	**444000**	**341500**	**1 081 500 €**	
Sous volet A2						
		Année 2024	**Année 2025**	**Année 2026**	**Total**	**Maître d'ouvrage concerné**
A2a: DIAGNOSTICS COMPLEMENTAIRES SUR LES COURS D'EAU NON INVENTORIES EN PHASE D'ELABORATION DU CONTRAT	Diagnostics complémentaires cours d'eau non inventoriés en phase d'élabo	10 000 €	0 €	0 €	10 000 €	EPAGE LL
A2b:ETUDE DE DEFINITION DE L'ENS "RIVIERE DE L'ANCE"		0 €	1 800 €	1 800 €	3 600 €	EPAGE LL
TOTAL		**10 000 €**	**1 800 €**	**1 800 €**	**13 600 €**	
Sous volet A3						
		Année 2024	**Année 2025**	**Année 2026**	**Total**	**Maître d'ouvrage concerné**
A3a-b-c: RESTAURATION DE LA CONTINUITE SUR LE TERRITOIRE DU CT LAV	Etude de faisabilité travaux continuité CTLAV					
TOTAL						

AR Prefecture
063-200007761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Sousvolet A4						
		Année 2024	Année 2025	Année 2026	Total	Maître d'ouvrage concerné
A4a: DIAGNOSTICS, ETUDES DE FAISABILITE ET ANIMATION FONCIERE POUR LA PRESERVATION ET LA RESTUARATION DES ZONES HUMIDES PRIORITAIRES	Action 1 : études de faisabilité, plans de gestion, CCTP Travaux Action 2 : animation foncière et gouvernance et partenariat Action 3 : évolution et suivis	51 500 €	51 000 €	51 500 €	154 000 €	CEN Auvergne
A4b: ANIMATION THEMATIQUE ZONES HUMIDES	Action 1 Animation et concertation autour des ZH Action 2: animation sur les zones humides à la demande Action 3: gouvernance et partenariat	54 200 €	55 400 €	55 400 €	165 000 €	CEN Auvergne & CEN Rhône-A
A4c: INVENTAIRES COMPLEMENTAIRES DES ZONES HUMIDES	Action 1: inventaire complémentaire des zone shumides supérieures ou ég action 2: inventaire complémentaire des zones humides comprises entre 0 action3: inventaire de la partie non inventoriée de la forêt domaniale du M action 4: participation à la prélocalisation des zones humides forestières pr	195 000 €	2 000 €	3 000 €	200 000 €	EPAGE LL & ONF
A4d: INVENTAIRE ET RESTAURATION DES MARES	Action 1: inventaire des mares Action 2: restauration des mares action 3: gouvernance et partenariat	35 000 €	50 000 €	50 000 €	135 000 €	EPAGE LL & CEN Auvergne
A4e-1: ZONE HUMIDE DE CHAMPDOLENT	Mise en oeuvre du plan de gestion	11 600 €	25 000 €	28 000 €	64 600 €	
A4e-2: ZONE HUMIDE DU CREUX DU BALAY	Etudes et suivis, accompagnement exploitants agricoles et animation travaux types	40 200 €	31 700 €	30 100 €	102 000 €	
A4e-3: RESTAURATION DE L'ETANG DU VILLARD	suivi, concertation et veille environnemental	0 €	0 €	0 €	0 €	
A4e-4: ZONE HUMIDE DE LA DIGONNIERE	Travaux de restauration suivis écologiques et hydrologique	51 600 €	27 000 €	0 €	78 600 €	
A4e-5: ZONE HUMIDE DE LA PLAINE ET PETITE PLAINE	Etudes, rédaction document de gestion travaux types	12 000 €	15 000 €	25 000 €	52 000 €	
A4e-6: ZONE HUMIDE DU VIALON	TERMINEE EN PHASE 2021-2023				0 €	
A4e-7: ZONE HUMIDE DES PRADEAUX	Travaux de restauration suivis hydrologique	11 000 €	65 000 €		76 000 €	
A4e-8: ZONE HUMIDE DES BALAYOUX	Travaux types	0 €	10 000 €	0 €	10 000 €	
A4e-9: RESTAURATION DES ZONES HUMIDES DE LA VALLEE DE L'ANCE	Travaux de restauration prévu dans les documents de gestion	95 000 €	95 000 €	90 000 €	280 000 €	
A4e-10: RESTAURATION DES ZONES HUMIDES DITES PRIORITAIRES	Travaux de restauration prévu dans les documents de gestion	60 000 €	40 000 €	50 000 €	150 000 €	
A4e-11: RESTAURATION DES ZONES HUMIDES DU PRES DU MARAIS ET DU MARAIS CHAPELLE	Mise en oeuvre des programmes du plan de gestion	46 000 €	52 500 €	41 500 €	140 000 €	
A4f: ACCOMPAGNEMENT DES PROPRIETAIRES A LA GESTION ECOLOGIQUE DES PLANS D'EAU	suivi et accompagnement technique	0 €	0 €	0 €	0 €	
A4g: ANIMATION D'EVENEMENT LIEES AUX MILIEUX AQUATIQUES	Organisation de petits évènement relatifs aux milieux aquatiques (2024-20 Organisation d'un évènement de plus grande ampleur (2026)	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €	
A4h: ANIMATION POUR LA PRESERVATION ET LA PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDES EN FORET PUBLIQUE	Action 1: appuis techniques local auprès des gestionnaires et propriètaires de forêts publiques Action2: animation/pilotage de la stratégie de préservation des ZH prioritaires en forêts publiques	18 500 €	8 500 €	2 000 €	29 000 €	
TOTAL		**681 600 €**	**528 100 €**	**436 500 €**	**1 646 200 €**	
SOUS-VOLET A5: luttre contre l'érosion de la biodiversité des milieux aquatiques						
		Année 2024	**Année 2025**	**Année 2026**	**Total**	**Maître d'ouvrage concerné**
A5a: SUIVI DES ESPECES PATRIMONIALES						
A5b: TRAVAUX COURANTS DE LUTTE CONTRE LES ESPECES VEGETALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES	RETIRER DE LA PROGRAMMATION 2024-2026					
TOTAL		**0 €**	**0 €**	**0 €**		
Sous volet A6						
		Année 2024	**Année 2025**	**Année 2026**	**Total**	**Maître d'ouvrage concerné**
A6a: VALORISATION DE LA ZONE HUMIDE DU CHAMPS DU CROS	TERMINEE EN 2021-2023					
A6b: VALORISATION DE LA TOURBIERE DE BARACUCHET	action 1 : étude de faisabilité pour l'aménagement du site action 2 : création d'un cheminement action 3 : création et pause de panneaux de sensibilisation	9 000 €	61 000 €		70 000 €	
TOTAL		**9 000 €**	**61 000 €**		**70 000 €**	

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Prévisionnel d'actions 2024-2026

Volet B : Quantité - Qualité

- 14 fiches action / 6 maîtres d'ouvrage (EPAGE, CA43, HLB, FDCUMA, GDA, HLCE)
- 4 nouvelles actions agricoles proposées (sous-volet B1)
- 1 nouvelle action zéro phyto (sous-volet B2)

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Prévisionnel d'actions 2024-2026

Volet B1 - animation agricole

- Actions poursuivies :
  - Implantation de haies (6000ml prévus)
  - Diagnostics d'exploitation (35 prévus entre 2024 et 2026)
  - Expérimentations sur le bâchage du fumier, pâturage d'hiver, semis
  - Animation et diagnostic de conversion à la bio et boite à outil
  - Etudes sur les filières bio émergentes
  - Organisation de concours agricoles + 1 salon
  - Animation collective sur la gestion du pâturage en des zones humides
- Actions non poursuivies
  - Accompagnement individuel sur la gestion des bio-agresseurs des cultures + pour la recherche de financement
  - accompagnement collectif vers le changement de pratiques
  - Animation ressource en eau et abreuvement

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Prévisionnel d'actions 2024-2026

Volet B1 : animation agricole

- 2 actions de la CA43 dans la fiche action B1b "Favoriser le changement de pratiques agricoles efficaces, ambitieux et durant, ainsi que des changements de systèmes"
- **Action 11 : réaliser un livrable sur le désherbage mécanique**
  → Objectifs :
  - diffuser la connaissance et la technique pour favoriser le changement de pratiques
  - donner aux agriculteurs durant les animations collectives de désherbage mécanique
  - Coût total estimatif : 4 700€ sur 1 an (50 % de cofinancements AELB)

- **Action 12 : Animation collective pour la gestion de l'enherbement**
  - → Objectifs :
  - Promouvoir les interventions mécaniques
  - Diffuser la connaissance
  - Coût total estimatif : 10 044€ sur 3 ans (50% de cofinancement AELB)

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Prévisionnel d'actions 2024-2026

Volet B1 : animation agricole

- 1 action en **co-maîtrise** d'ouvrage entre la CA43, Mission Haies et la FDCUMA dans la Fiche action b1d - Restaurer et valoriser les éléments paysagers

- **Action 4 : Animation et accompagnement collectif d'un groupe d'agriculteurs en faveur de changement de pratiques bocagères et sylvo-pastorales**
  - Sensibilisation technique collective aux enjeux du bocage des agriculteurs
  - Accompagnement individuel ⇒ plan de gestion simplifié
  - Les préconisations aboutiront à des actions collectives (chantier de coupe, chantier de déchiquetage) et individuel (plantation)
- Objectifs :
  - Préserver/Restaurer le maillage
  - Réduire les transferts / Améliorer la rétention d'eau

- Coût estimatif : 87 338 € sur 3 ans (50% de cofinancement AELB)

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Prévisionnel d'actions 2024-2026

Volet B1 : animation agricole

- 1 fiche action de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire (avec FDCUMA)
- **Action : Implanter une interculture dans une culture d'hiver et une de printemps.**

- → Objectifs :
  - favoriser la couverture des sols
  - réduire la pression en adventice, limiter le recours aux pesticides
  - préserver la structure des sols
  - recycler les éléments fertilisants
- Coût total estimatif : 28980 € (50 % de cofinancement AELB)

- Remarques ? Validation du programme agricole 2024-2026 ? Oppositions aux actions proposées ?

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Prévisionnel d'actions 2024-2026

Volet B2 : Pollution domestique

- intégration d'une action zéro phyto dans la FA B2a
- **Action : "réduction de l'impact des traitements phytosanitaires sur des secteurs identifiés"**

- → Objectifs :
  - réduire l'impact des traitements phytosanitaire des collectivités
  - préserver la qualité de l'eau
  - améliorer la connaissance
- Coût total estimatif : 4 500 € (Départements au prorata, AELB)

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

sous-volet B1						
FA	**descriptions**	**année 2024**	**année 2025**	**année 2026**	**total**	**Maître d'ouvrage concerné**
B1a - créer un réseau d'acteurs agricoles	animation du CT et du salon	6 110,00€	6 110,00€	33 030,00€	45 250,00€	EPAGE + Haute Loire Bio + GDA FOREZ + Haute-Loire Conseil Elevage
B1b - favoriser les changements de pratiques	diagnostic + expérimentations + animation	82 808,00 €	58 108,00 €	65 298,00 €	206 214,00 €	EPAGE + Chambre d'agriculture + Haute Loire Bio
B1c - Etudier et structurer les filières innovantes en AB	Etude filières	26 460,00€	26 460,00€	26 460,00€	79380	Haute-Loire Bio
B1d - Restaurer et valoriser les élements paysagers	diagnostic et restauration bocage	41 964,00 €	42 964,00 €	43 234,00 €	128 162,00 €	EPAGE + Chambre d'agriculture de Haute-Loire + FDCUMA + Missions Haies
B1e - Maintenir une couverture permanente des sols	expérimentation	4 168,00€	38 608,00€	41 416,00€	121392	Haute-Loire Conseil Elevage + Chambre d'agriculture + GDA Forez Emblavez
B1 f - préserver les zones humides agricoles	animation	2 200,00 €	3 880,00 €	3 880,00 €	9 960,00 €	EPAGE LL
		200 910,00 €	176 130,00 €	213 318,00 €	590 358,00 €	
Sous-Volet B2						
B2a - Animation auprès des collectivités pour l'amélioration des rejets domestiques et la resorption des rejets directs		1 500 €	1 500 €	1 500 €	4 500 €	EPAGE LL
Sous - volet B3						
B3a - Diagnostic, état des lieux et stratégie de gestion des rejets des entreprises et amélioration des la connaissance des rejets en micropolluants	Terminée en phase 2021-2023 (micro-polluants) pas de reconduite de l'étude diagnostic de la qualité des rejets des entreprises					EPAGE LL
B3b - Evaluation des impacts de l'aménagement hydroélectrique de passouira sur l'Ance du Nord	Terminée en phase 2021-2023					EPAGE LL
Sous-volet B4						
B4a - Etude "HMUC"	Terminée en phase 2021-2023					EPAGE LL
B4b - Mise en place et animation d'un réseau de suivi des étiages	Annulée					EPAGE LL
Sous-volet B5						
B5a - Etudes de réduction de la vulnérabilité face au risque inondation	Hors CT					EPAGE LL
B5b - Entretien régulier de la ripisylve sur les secteurs a enjeux	Hors CT	0 €	0 €	0 €	0 €	EPAGE LL
TOTAL		**366 120,00€**	**353 760,00€**	**428 136,00€**	**1 185 216,00€**	

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Prévisionnel d'actions 2024-2026

Volet C : Communication et suivi

- 3 fiches action / 1 maîtres d'ouvrage

- Poursuite des actions de communication du contrat territorial
- Poursuite des programmes pédagogiques par prestations externes
- Suivi de la qualité d'eau en 2026
- Etude bilan en fin de contrat

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

VOLET C "communication et suivi"						
C1 "communication"						
FA	**descriptions**	**année 2024**	**année 2025**	**année 2026**	**total**	**Maître d'ouvrage concerné**
C1A	Action 1 : mise en œuvre du plan de communication	20000	20000	20000	60000	EPAGE LL
C1B	Action 1 : conduite d'un programme pédagogique	6000	6000	6000	18000	EPAGE LL
TOTAL		**26000**	**26000**	**26000**	**78000**	
Sous volet C2 "suivi, bilan, évaluation"						
C1B	Action 1 : Etude de la qualité des eaux	0	0	80000	80000	EPAGE LL
	Action 2 : Bilan du contrat territorial	0	0	100000	100000	EPAGE LL
TOTAL		**0**	**0**	**180000**	**180000**	

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Prévisionnel d'actions 2024-2026

Volet D : Structure

- Conservation du nombre d'ETP actuel à cellule d'animation constante
- Proposition d'augmentation de 0,5 ETP technicien rivière (en parallèle d'un 0,5 ETP CT LV)
- Objectif: répondre au calibrage de la deuxième programmation

Selon l'arbitrage, le dimensionnement des actions pourra être réévalué.

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

VOLET D "structure"						
D1 Assurer le suivi administratif et financier des actions et coordonner l'ensemble des dossiers						
FA	**descriptions**	**année 2024**	**année 2025**	**année 2026**	**total**	**Maître d'ouvrage concerné**
D1A	Animation et coordination du contrat territorial 1 ETP	53 000 €	53 000 €	53 000 €	159 000 €	EPAGE LL
	Animation thématique « cours d'eau » 2 ETP	106 000 €	106 000 €	106 000 €	318 000 €	EPAGE LL
D1B	Proposition: Animation thématique « cours d'eau » 0,5 ETP	27 500 €	27 500 €	27 500 €	82 500 €	
	Animation thématique « agricole » 0,4 ETP	22 500 €	22 500 €	22 500 €	67 500 €	EPAGE LL
D1C	Animation thématique « agricole » 0,6 ETP	33 750 €	33 750 €	33 750 €	101 250 €	EPAGE LL
D1D	Appui SIG 0,25 ETP	14 000 €	14 000 €	14 000 €	42 000 €	EPAGE LL
D1E	Appui « administratif » 0,5 ETP	22 500 €	22 500 €	22 500 €	67 500 €	EPAGE LL
D1F	Animation thématique « sensibilisation »	0 €	0 €	0 €	0 €	EPAGE LL
D1G	Animateur thématique "zones humides" 1 ETP	53 000 €	53 000 €	53 000 €	159 000 €	
TOTAL sans 0,5 ETP en plus		**304 750 €**	**304 750 €**	**304 750 €**	**914 250 €**	
TOTAL avec 0,5 ETP en plus		**332 250 €**	**332 250 €**	**332 250 €**	**996 750 €**	
Sous volet D2 "Assurer la mise en œuvre des actions sur les milieux aquatiques et humides et la médiation auprès des riverains"						
D2A	Technicien de rivière 2 ETP	0	0	0	0	EPAGE LL
D2B	Technicien zones humides 1 ETP	0	0	0	0	EPAGE LL
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

Conclusion

- 77 % de réalisation par rapport au prévisionnel financier
- 25 % d'objectif linéaire réalisé en terme de travaux
- 3 nouveaux maîtres d'ouvrage qui souhaite intégrer le CTLAV
- 3 nouvelles fiches actions proposées
- Beaucoup de demandes en termes de travaux d'entretien rivulaire et restauration de berges EPCI + PI,
- Un budget estimé à 5 090 766 € pour 2024-2026

AR Prefecture
063-200070761-20231130-2023_30_11_21C-DE
Reçu le 01/12/2023

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

Maîtres d'ouvrage, financeurs et partenaires
